

**Отчет за 12 месяцев 2021 года об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
(по оперативным данным)**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2021 год*		Оперативный факт за 12 мес. 2021 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)		
	ВСЕГО на 2021 год			42 988 049		29 771 359	-13 216 690	69%
	Замена участков нефтепроводов	км	59	16 235 763	59	11 155 655	-5 080 108	69%
1	МН "Узень-Атырау-Самара" ф1020 мм. Замена трубопровода на участках 230-244км, 267-282км, 284-291км, L=36 км	км	36	5 261 858	36	5 261 858	0	100%
2	Замена участков трубопровода МН «Павлодар - Шымкент» ф 820 мм на участке 715 - 724,5 км (общая протяженность 9,5 км) со строительством вдольтрассовых проездов на участке 715-724,5 км и водопропусков)	км	9,5	3 476 845	9,5	3 233 538	-243 307	93%
3	МН "Мартыши-Атырау" ф530. Замена трубы на участках 0-8 км, 18-20 км общей протяженностью 9,3 км	км	9,3	1 899 496	9	1 866 330	-33 166	98%
4	МН «Павлодар – Шымкент» Д-820 мм. Замена трубопровода на участке 1502,4-1506,4 км (4 км)	км	4	888 827	4	793 929	-94 898	89%
5	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км		4 708 737		0	-4 708 737	0%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН		16	21 618 160	6	14 246 132	-7 372 028	66%
6	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	объект		976 550		581 555	-394 995	60%
7	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Реконструкция резервуарного парка	объект		300 000		124 827	-175 173	42%
8	ГНПС Кумколь. Реконструкция резервуарного парка	объект		100 000		23 298	-76 702	23%
9	Строительство химических лабораторий	объект	4	1 938 420		1 044 466	-893 955	54%
10	НПС «Жетыбай». Реконструкция зданий операторной и химической лаборатории	объект	1	951 623		627 685	-323 938	66%
11	НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОИД нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"	объект	1	943 200		302 044	-641 156	32%

**Отчет за 12 месяцев 2021 года об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
(по оперативным данным)**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2021 год*		Оперативный факт за 12 мес. 2021 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)		
12	НПС Бейнеу. Замена технологических трубопроводов	объект	1	1 289 200		610 051	-679 149	47%
13	Строительство камеры приема-пуска СОИД на ПСП 1235 км нефтепровода Узень-Атырау-Самара	объект	1	1 464 661		113 912	-1 350 749	8%
14	«ГНПС Узень. Реконструкция электроснабжения»	объект	1	3 998 114	1	3 998 114	0	100%
15	Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов	система		1 934 093		1 934 093	0	100%
16	Модернизация существующей сети ВОЛС	узел	5	462 300	5	462 300	0	100%
17	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система		1 371 500		283 890	-1 087 610	21%
18	НПС "Жетыбай". Реконструкция магистральной насосной	объект		492 824		124 830	-367 995	25%
19	НПС "Косчагил". Внешнее электроснабжение	объект		107 311		3 159	-104 152	3%
20	КНУ. Модернизация энергоснабжения пунктов подогрева нефти с заменой электроприводов участвующих в аварийных защитах печей подогрева»	объект		914 961		216 288	-698 673	24%
21	НПС им. Т. Касымова. Реконструкция РВС-20000тм3 №10 (понтон)	объект	1	67 915		13 089	-54 825	19%
22	Замена технологических трубопроводов на участках входного и выходного коллектора пункта подогрева нефти НПС «Бейнеу»	объект	1	384 955		299 223	-85 732	78%
23	НПС им. Т. Касымова. Ремонт железобетонных емкостей объемом 1200м3	объект		167 168		60 695	-106 474	36%
24	Строительство ВОЛС, внедрение СЛТМ и СОН МН "Мартыши-Атырау"	объект		445 601		458 237	12 636	103%
25	Реконструкция камер пуска - приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" ф 820 мм КППОУ ГНПС "Чулак-Курган"	объект		308 175		307 108	-1 066	100%
26	Комплексная реконструкция системы связи в ПКУ	система		1 152 256		963 115	-189 141	84%
27	Реконструкция системы аварийного энергоснабжения узлов связи	система		256 128		256 128	0	100%

**Отчет за 12 месяцев 2021 года об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
(по оперативным данным)**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2021 год*		Оперативный факт за 12 мес. 2021 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)		
28	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов	система		291 373		287 504	-3 868	99%
29	Внедрение систем периметрального видеонаблюдения и системы контроля доступа	система		622 756		473 534	-149 222	76%
30	Комплексная модернизация телефонной сети до IP телефонии	система		300 436		300 436	-0	100%
31	Приобретение и настройка устройств сетевой безопасности на объектах СИКН/КУУН	система		186 750		186 750	0	100%
32	Модернизация системы охраны нефтепровода	система		189 889		189 800	-89	100%
33	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	149	3 712 862	144	3 004 800	-708 062	81%
33.1	Выключатель с выкатным элементом	ед.	3	10 800	3	10 800	0	100%
33.2	Выключатель вакуумный	ед.	2	12 800	2	12 800	0	100%
33.3	Устройство размыва донных отложений	ед.	10	169 710	10	169 710	0	100%
33.4	Аппарат управления оперативным током	ед.	1	17 412	1	17 412	0	100%
33.5	Котел водогрейный МС1600/6	ед.	1	11 200	1	11 200	0	100%
33.6	Система контроля изоляции	ед.	1	9 800	1	9 800	0	100%
33.7	Тепловизор	ед.	1	5 190	1	5 190	0	100%
33.8	Установка измерения тормозных систем	ед.	1	13 000	1	13 000	0	100%
33.9	Стенд контроля подшипников качения СВК-А	ед.	1	30 211	1	30 211	0	100%
33.10	Вставка электроизолирующая	ед.	2	23 500	2	23 500	0	100%
33.11	Система для центровки валов	ед.	4	61 731	4	61 731	0	100%
33.12	Стенд для испытания усилие 400 кгс	ед.	1	6 140	1	6 140	0	100%
33.13	Установка электролизная САНЕР 5-400	ед.	1	6 965	1	6 965	0	100%
33.14	Устройство размагничивания трубопроводов	ед.	1	6 000	1	6 000	0	100%
33.15	Дефектоскоп	ед.	1	8 070	1	8 070	0	100%
33.16	Машина проявочная	ед.	1	10 880	1	10 880	0	100%
33.17	Трассоискатель	ед.	2	10 612	2	10 612	0	100%
33.18	Скребок очистной манжетный ДУ 400мм	ед.	1	4 650	1	4 650	0	100%

**Отчет за 12 месяцев 2021 года об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
(по оперативным данным)**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2021 год*		Оперативный факт за 12 мес. 2021 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)		
33.19	Трубопровод магистральный полевой (автономная установка)	ед.	2	15 200	2	15 200	0	100%
33.20	Азотно-компрессорная станция	ед.	1	207 640	0	0	-207 640	0%
33.21	Мачта осветительная	ед.	3	48 153	3	48 153	0	100%
33.22	Задвижка стальная ДУ500 с электрическим приводом	ед.	1	13 098	1	13 098	0	100%
33.23	Задвижка стальная приварная ДУ 500 РУ 75	ед.	1	10 498	1	10 498	0	100%
33.24	Задвижка ДУ 800 РУ 25	ед.	1	12 998	1	12 998	0	100%
33.25	Подъемник телескопический монтажный	ед.	1	35 020	1	35 020	0	100%
33.26	Привод электрический к задвижке ДУ500	ед.	8	43 200	8	43 200	0	100%
33.27	Привод электрический с редуктором	ед.	6	44 630	6	44 630	0	100%
33.28	Скребок очистной ДУ530	ед.	2	8 100	2	8 100	0	100%
33.29	Трансформатор КТП- 40/10	ед.	2	15 920	2	15 920	0	100%
33.30	Трансформатор напряжения 35кВ	ед.	3	10 380	3	10 380	0	100%
33.31	Привод электрический АУМА	ед.	7	40 880	7	40 880	0	100%
33.32	Задвижка стальная фланцевая ДУ 400 РУ16	ед.	1	11 998	1	11 998	0	100%
33.33	Привод электрический к задвижке ДУ700	ед.	6	48 828	6	48 828	0	100%
33.34	Устройство размыва донных отложений ДИОГЕН 500мм	ед.	3	47 940	3	47 940	0	100%
33.35	Насосный агрегат НПВ-1250/60	ед.	1	326 858	0	0	-326 858	0%

**Отчет за 12 месяцев 2021 года об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
(по оперативным данным)**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2021 год*		Оперативный факт за 12 мес. 2021 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)		
33.36	Установка насосная DNUDO (OIL)-300/360	ед.	4	256 710	4	256 710	0	100%
33.37	Насос НМ 1250/260	ед.	4	968 788	4	968 788	0	100%
33.38	Электродвигатель 4 АЗМВ -1250/10000	ед.	2	193 030	2	193 030	0	100%
33.39	Насос ГНОМ-40/25	ед.	2	2 800	2	2 800	0	100%
33.40	Насос центробежный	ед.	6	7 680	6	7 680	0	100%
33.41	Насос погружной	ед.	4	13 600	4	13 600	0	100%
33.42	Блок контейнерный ДЭС 250кВА	ед.	1	21 000	1	21 000	0	100%
33.43	Дизельная электростанция	ед.	1	13 800	1	13 800	0	100%
33.44	Электродвигатель СТДП-1250кВт 10кВ	ед.	2	277 600	2	277 600	0	100%
33.45	Электродвигатель СТДП-1250-23У4 с 10кВ	ед.	1	106 700	1	106 700	0	100%
33.46	Агрегат насосный НБ 50	ед.	1	17 500	1	17 500	0	100%
33.47	Агрегат электронасосный НШ-40-4-19.5/46	ед.	3	6 450	3	6 450	0	100%
33.48	Электронасос ВВН 1-6 вакуумный водокольцевой	ед.	2	3 640	2	3 640	0	100%
33.49	Электродвигатель SIEMENS	ед.	3	169 347	0	0	-169 347	0%
33.50	Агрегат электронасосный СМ-100-65-200	ед.	1	1 650	1	1 650	0	100%
33.51	Агрегат насосный 12 на 9х4	ед.	1	5 500	1	5 500	0	100%
33.52	Агрегат насосный НВ 50/50	ед.	1	6 700	1	6 700	0	100%
33.53	Анализатор серы в нефти	ед.	1	12 939	1	12 939	0	100%
33.54	Генератор азота	ед.	1	4 950	1	4 950	0	100%
33.55	Генератор водорода	ед.	1	2 161	1	2 161	0	100%
33.56	Термостат циркуляционный	ед.	1	2 199	1	2 199	0	100%
33.57	Анализатор фракционного состава	ед.	3	96 000	3	96 000	0	100%
33.58	Аппарат определения температуры застывания нефти	ед.	1	25 300	1	25 300	0	100%
33.59	Холодильник лабораторный	ед.	2	7 168	2	7 168	0	100%
33.60	Экстрактор ПЭ-8110	ед.	2	1 058	2	1 058	0	100%
33.61	Аппарат МХП-ПХП	ед.	1	866	1	866	0	100%
33.62	Бидистиллятор	ед.	1	5 107	1	5 107	0	100%
33.63	Компрессор хроматэк	ед.	1	573	1	573	0	100%

**Отчет за 12 месяцев 2021 года об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
(по оперативным данным)**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2021 год*		Оперативный факт за 12 мес. 2021 года		Отклонение (абс)	Исполнение , (%)
			Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без налога на добавленную стоимость)		
33.64	Фотокалориметр кфк-3	ед.	1	2 406	1	2 406	0	100%
33.65	Экспресс-анализатор	ед.	1	16 600	1	16 600	0	100%
33.66	Дистиллятор GFL-2012	ед.	2	6 923	2	6 923	0	100%
33.67	Источник бесперебойного питания 6400 вт	ед.	4	15 800	4	15 800	0	100%
33.68	Вискозиметр	ед.	3	80 304	3	76 086	-4 218	95%
34	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	32	1 421 265	29	1 364 773	-56 492	96%
34.1	Полуприцеп-тяжеловоз	ед.	2	46 400	2	46 400	0	100%
34.2	Автотопливозаправщик АТЗ	ед.	1	18 000	1	18 000	0	100%
34.3	Автобус вахтовый на базе КАМАЗ	ед.	2	73 000	2	73 000	0	100%
34.4	Погрузчик универсальный	ед.	2	108 000	2	108 000	0	100%
34.5	Тягач седельный	ед.	1	36 500	1	36 200	-300	99%
34.6	Полуприцеп раздвижной низкорамный	ед.	1	38 000	1	37 808	-192	99%
34.7	Универсальная дорожная машина К-702МВА-УДМТ	ед.	1	85 000	1	85 000	0	100%
34.8	КАМАЗ 43118 бортовой с КМУ	ед.	2	120 000	2	120 000	0	100%
34.9	Автобус вахтовый на базе КамАЗ - 43118	ед.	3	111 000	3	111 000	0	100%
34.10	Экскаватор-погрузчик HIDROMEK	ед.	2	73 600	2	73 600	0	100%
34.11	Погрузчик вилочный	ед.	1	16 325	1	16 325	0	100%
34.12	Самосвал КамАЗ-45141	ед.	3	109 500	3	109 500	0	100%
34.13	Лаборатория на базе КамАЗ-43118	ед.	1	96 000	1	96 000	0	100%
34.14	Автомобиль АЦ-32 на базе КАМАЗ-43118	ед.	1	56 000	1	56 000	0	100%
34.15	Установка ППУ на базе КАМАЗ	ед.	2	111 000	2	111 000	0	100%
34.16	Полуприцеп	ед.	1	9 500		0	-9 500	0%
34.17	Тягач седельный КАМАЗ	ед.	1	34 990	1	34 990	0	100%
34.18	Грузопассажирский автомобиль на базе Камаз	ед.	1	75 950	1	75 950	0	100%
34.19	Автоцистерна АЦ на шасси ГАЗОН	ед.	1	28 500		0	-28 500	0%
34.20	Трактор колесный	ед.	1	18 000		0	-18 000	0%
34.21	Автомобиль КАМАЗ 43118 ЯМОБУР с КМУ и люлькой	ед.	1	73 500	1	73 500	0	100%
34.22	Автомобиль АРМТ на базе КАМАЗ	ед.	1	82 500	1	82 500	0	100%

* АО «КазТрансОйл» направлено заявление об изменении утвержденной инвестиционной программы акционерного общества «КазТрансОйл» на 2021-2025 годы без повышения тарифа, в части переноса показателей 2021 года на следующий календарный год по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии

МН «Мартыши-Атырау» ф530. Замена трубы на участках 0-8 км, 18-20 км общей протяженностью 9,3 км



Замена участков трубопровода МН «Павлодар - Шымкент» ф 820 мм на участке 715 - 724,5 км (общая протяженность 9,5 км) со строительством вдольтрассовых проездов на участке 715-724,5 км и водопропусков)




Ссылка на видео: <https://youtu.be/JZm6-HHu6ek>

МН «Павлодар – Шымкент» Д-820 мм. Замена трубопровода на участке 1502,4-1506,4 км
(4 км)



Ссылка на видео: https://youtu.be/6s5ttsg6_ic

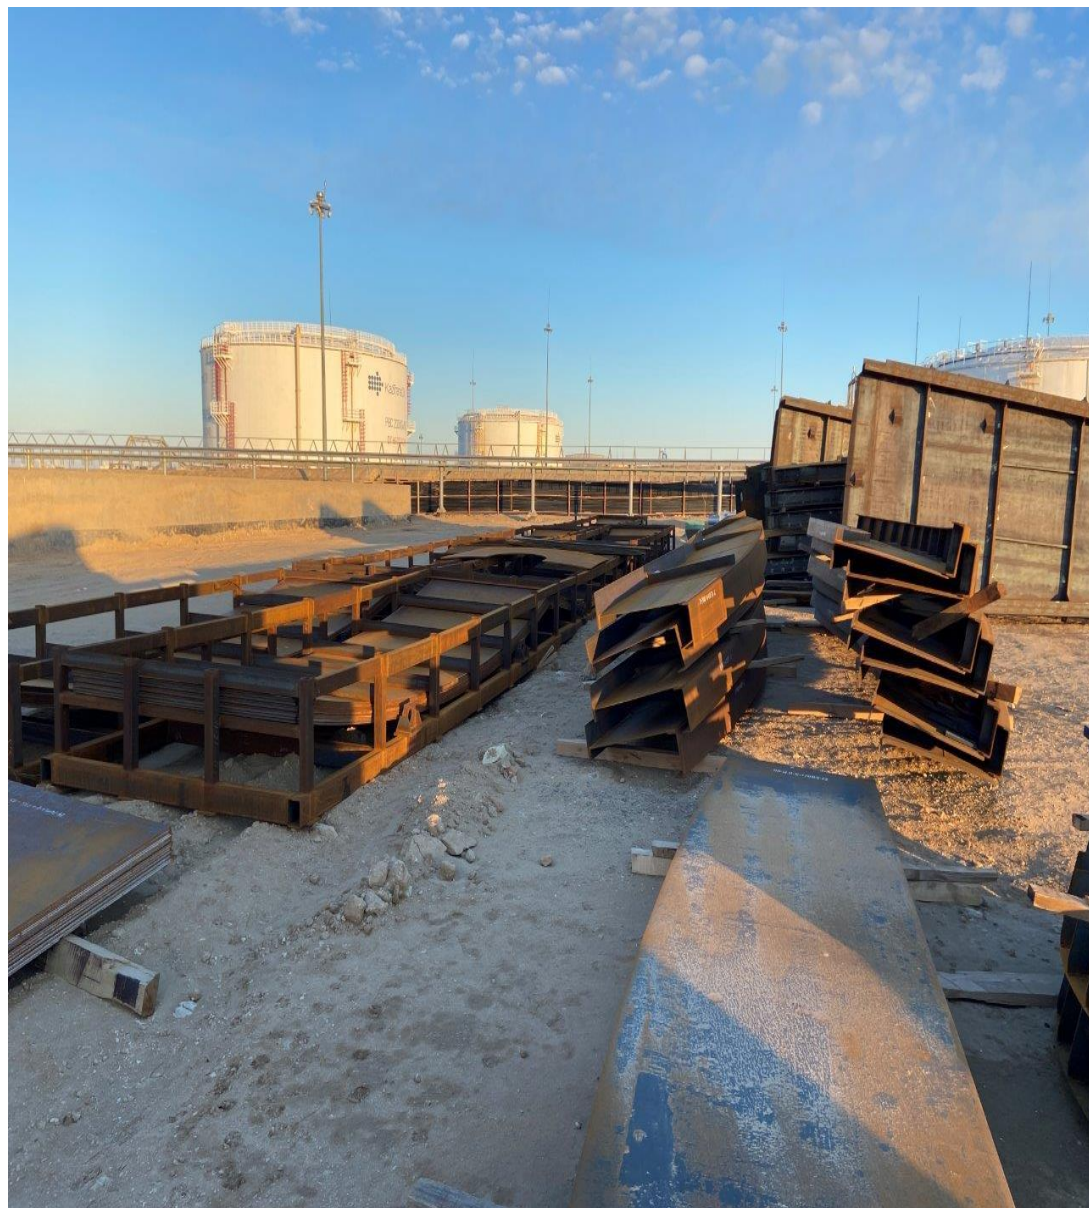



НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОиД нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"



НПС Бейнеу. Замена технологических трубопроводов



Строительство камеры приема-пуска СОид на ПСП 1235 км нефтепровода Узень-Атырау-Самара






КНУ. Модернизация энергоснабжения пунктов подогрева нефти с заменой электроприводов участвующих в аварийных защитах печей подогрева»



Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов

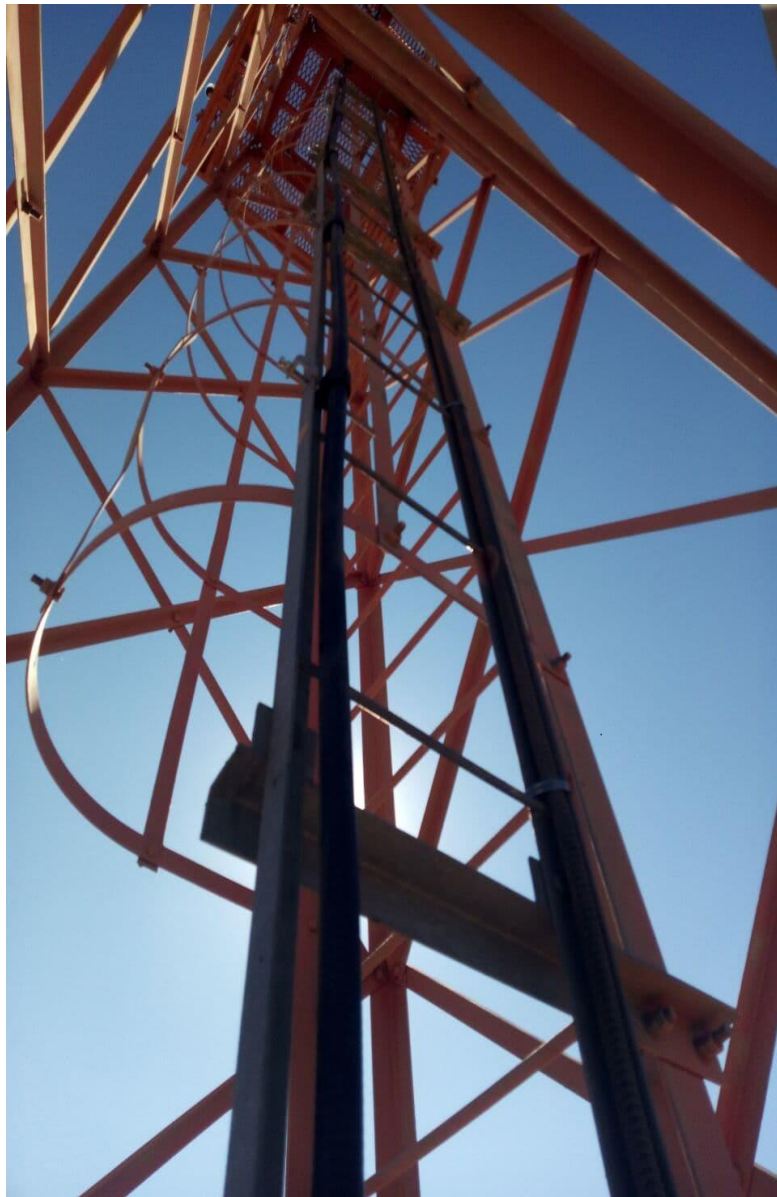

Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления

