

**Отчет за 1 квартал 2022 года об исполнении утвержденной инвестиционной программы  
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»  
(по оперативным данным)**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2022 год		Оперативный факт за 1 квартал 2022 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
<b>Мероприятия инвестиционной программы 2021 года, перенесенные на 2022 год по причинам, не зависящим от субъекта</b>								
	<b>ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2021 года на 2022 год</b>			<b>23 798 294</b>		<b>5 990 277</b>	<b>-17 808 017</b>	<b>25%</b>
	<b>Замена участков нефтепроводов</b>	<b>км</b>	<b>23</b>	<b>10 973 905</b>		<b>4 557 928</b>	<b>-6 415 977</b>	<b>42%</b>
1	Замена участков трубопровода МН «Павлодар - Шымкент» ф 820 мм на участке 715 - 724,5 км (общая протяженность 9,5 км) со строительством вдольтрассовых проездов на участке 715-724,5 км и водопропусков	км	9,5	3 476 845		0	-3 476 845	0%
2	МН "Мартыши-Атырау" ф530. Замена трубы на участках 0-8 км, 18-20 км общей протяженностью 9,3 км	км	9,3	1 899 496		0	-1 899 496	0%
3	МН «Павлодар – Шымкент» Д-820 мм. Замена трубопровода на участке 1502,4-1506,4 км (4 км)	км	4	888 827		0	-888 827	0%
4	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км		4 708 737		4 557 928	-150 809	97%
	<b>Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН</b>		<b>10</b>	<b>12 093 045</b>		<b>936 144</b>	<b>-11 156 900</b>	<b>8%</b>
5	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	объект		976 550		0	-976 550	0%
6	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Реконструкция резервуарного парка	объект		300 000		0	-300 000	0%
7	ГНПС Кумколь. Реконструкция резервуарного парка	объект		100 000		13 003	-86 997	13%
8	Строительство химических лабораторий	объект	4	1 938 420		0	-1 938 420	0%
9	НПС «Жетыбай». Реконструкция зданий операторной и химической лаборатории	объект	1	951 623		0	-951 623	0%
10	НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОИД нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"	объект	1	943 200		137 777	-805 424	15%
11	НПС Бейнеу. Замена технологических трубопроводов	объект	1	1 289 200		0	-1 289 200	0%
12	Строительство камеры приема-пуска СОИД на ПСП 1235 км нефтепровода Узень-Атырау-Самара	объект	1	1 464 661		449 986	-1 014 675	31%
13	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система		1 371 500		0	-1 371 500	0%
14	НПС "Жетыбай". Реконструкция магистральной насосной	объект		492 824		0	-492 824	0%
15	НПС "Косчагил". Внешнее электроснабжение	объект		107 311		0	-107 311	0%
16	КНУ. Модернизация энергоснабжения пунктов подогрева нефти с заменой электроприводов участвующих в аварийных защитах печей подогрева»	объект		914 961		163 675	-751 286	18%

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2022 год		Оперативный факт за 1 квартал 2022 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
17	НПС им. Т. Касымова. Реконструкция РВС-20000м3 №10 (понтон)	объект	1	67 915		0	-67 915	0%
18	Замена технологических трубопроводов на участках входного и выходного коллектора пункта подогрева нефти НПС «Бейнеу»	объект	1	384 955		85 732	-299 223	22%
19	НПС им. Т. Касымова. Ремонт железобетонных емкостей объемом 1200м3	объект		167 168		67 682	-99 486	40%
20	Внедрение систем периметрального видеонаблюдения и системы контроля доступа	система		622 756		18 289	-604 467	3%
21	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	5	703 845		496 205	-207 640	70%
21.1	Азотно-компрессорная станция	ед.	1	207 640		0	-207 640	0%
22.2	Насосный агрегат НПВ-1250/60	ед.	1	326 858	1	326 858	0	100%
23.3	Электродвигатель SIEMENS	ед.	3	169 347	3	169 347	0	100%
22	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	2	27 500		0	-27 500	0%
22.1	Полуприцеп	ед.	1	9 500		0	-9 500	0%
22.2	Трактор	ед.	1	18 000		0	-18 000	0%
<b>Инвестиционная программа на 2022 год</b>								
	<b>ВСЕГО на 2022 год</b>			<b>42 277 820</b>		<b>371 072</b>	<b>-41 906 748</b>	<b>1%</b>
	<b>Замена участков нефтепроводов</b>	<b>км</b>	<b>66</b>	<b>30 318 384</b>		<b>0</b>	<b>-30 318 384</b>	<b>0%</b>
1	МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках общей протяженностью 63 км	км	13	7 980 319		0	-7 980 319	0%
2	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км	40	16 988 884		0	-16 988 884	0%
3	Замена участка трубопровода МН "Павлодар-Шымкент" Ø820 мм, основная нитка: 5,3 – 16,9км общей протяженностью 11,6 км	км	11,6	4 560 473		0	-4 560 473	0%
4	«Реконструкция МН «Павлодар-Шымкент» Ø820мм на участке 539,212-540,412км протяженностью 1,2 км»	км	1	625 620		0	-625 620	0%
5	МН "Узень-Атырау-Самара" Д 720 мм. Реконструкция участка на 1173 км	км	0,4	163 088		0	-163 088	0%
	<b>Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН</b>		<b>13</b>	<b>11 959 435</b>		<b>371 072</b>	<b>-11 588 363</b>	<b>3%</b>
6	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3	объект	2	1 972 892		0	-1 972 892	0%
7	ГНПС Кумколь. Строительство РВС-10000м3	объект	2	1 554 153		0	-1 554 153	0%
8	ГНПС Узень. Демонтаж-монтаж РВС - 20000 м3 №15	объект	1	632 601		0	-632 601	0%
9	НПС Жетыбай. Реконструкция резервуарного парка 10000м3	объект	2	2 483 367		0	-2 483 367	0%
10	НПС Жетыбай. Реконструкция магистральной насосной	объект	1	2 027 512		0	-2 027 512	0%
11	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" ф 820мм КППОУ НПС "Сузак", КППОУ ГНПС "Чулак-Курган", КПОУ ПСП "Шымкент"	объект	1	176 057		0	-176 057	0%
12	МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км	объект	1	526 144		0	-526 144	0%
13	Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов	система	1	1 256 374		371 072	-885 302	30%
14	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система	1	939 880		0	-939 880	0%
15	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов	система	1	390 457		0	-390 457	0%


**МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км**



# ГНПС Кумколь. Реконструкция резервуарного парка



# НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОид нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"

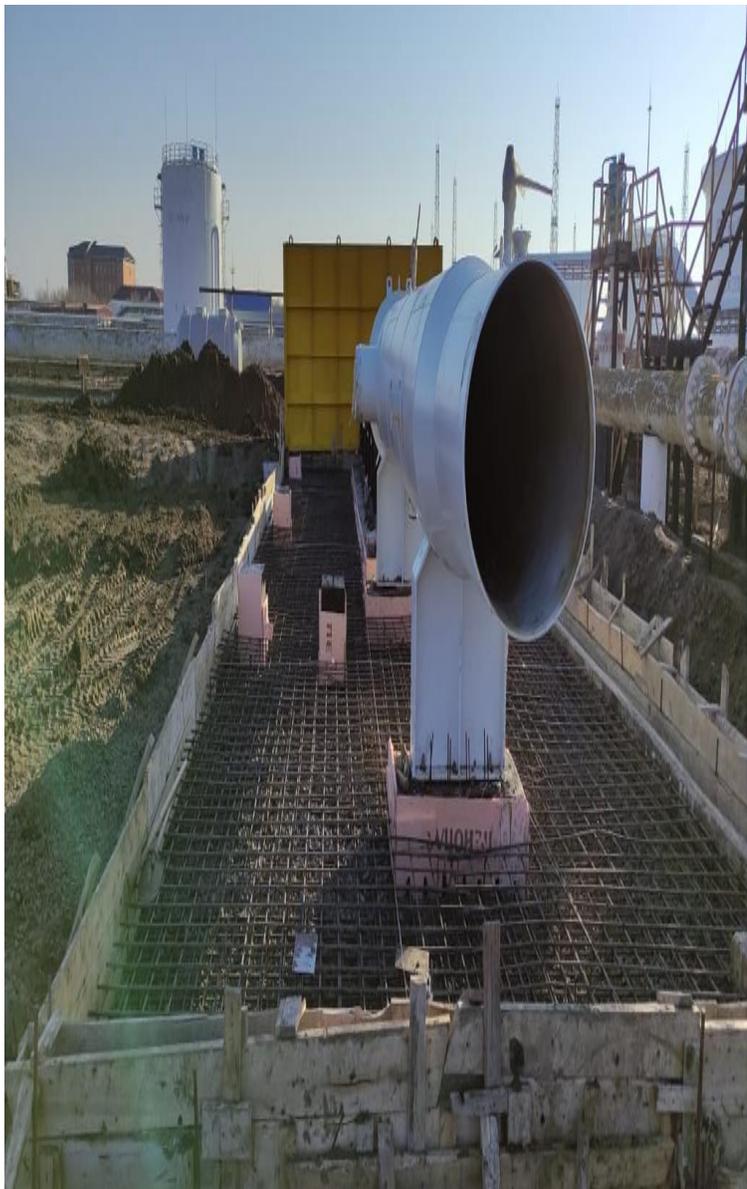

# Строительство камеры приема-пуска СОид на ПСП 1235 км нефтепровода Узень-Атырау-Самара





Ссылка на видео <https://www.youtube.com/watch?v=IFFcrE-xijc>

**КНУ. Модернизация энергоснабжения пунктов подогрева нефти с заменой электроприводов участвующих в аварийных защитах печей подогрева»**



# Замена технологических трубопроводов на участках входного и выходного коллектора пункта подогрева нефти НПС «Бейнеу»

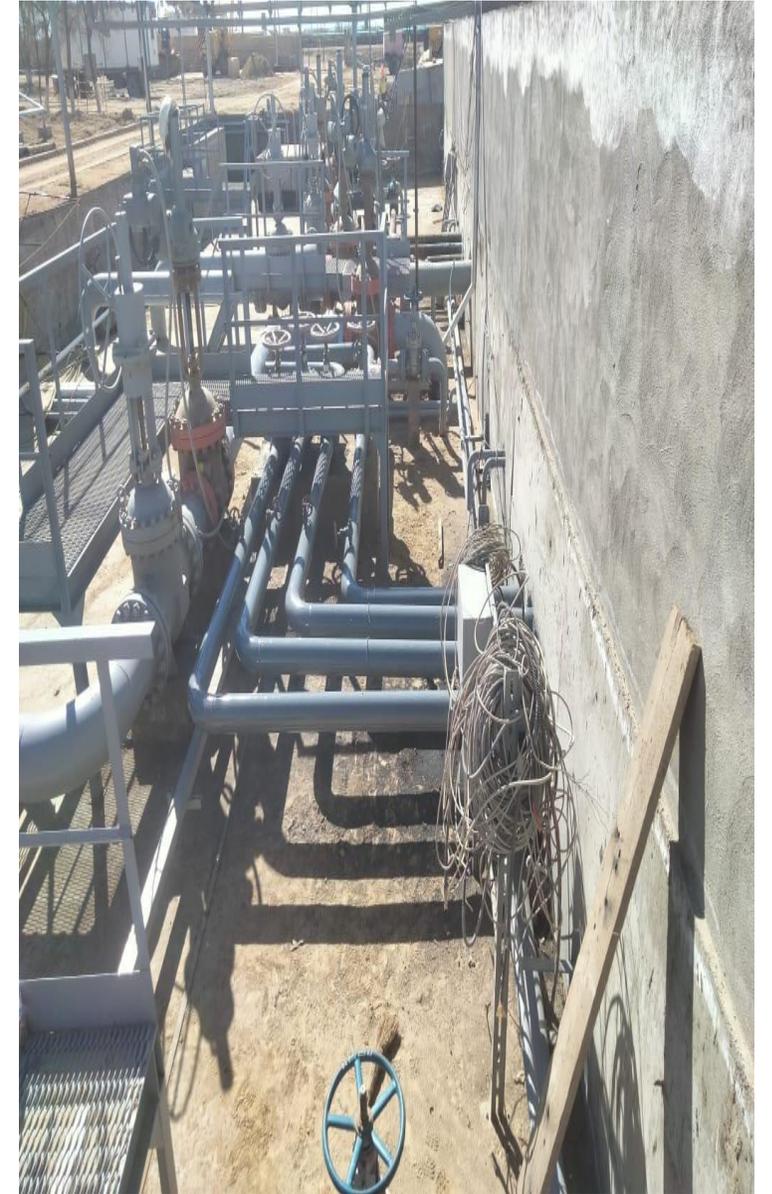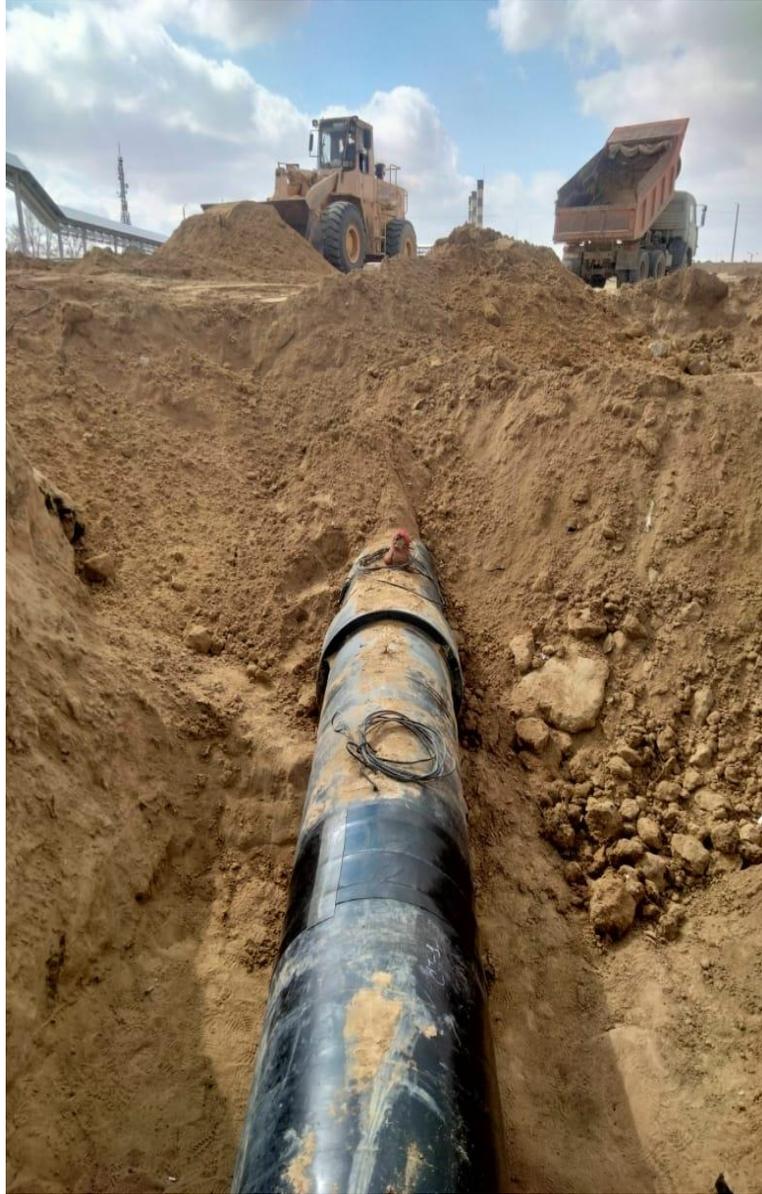

НПС им. Т. Касимова. Ремонт железобетонных емкостей объемом 1200м3



**Внедрение систем периметрального видеонаблюдения и системы контроля доступа**



# Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов

