

**Отчет за 1 полугодие 2022 года об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
(по оперативным данным)**


№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2022 год		Оперативный факт за 1 полугодие 2022 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
Мероприятия инвестиционной программы 2021 года, перенесенные на 2022 год по причинам, не зависящим от субъекта								
	ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2021 года на 2022 год			23 798 294		7 641 747	-16 156 547	32%
	Замена участков нефтепроводов	км	23	10 973 905		4 830 322	-6 143 583	44%
1	Замена участков трубопровода МН «Павлодар - Шымкент» ф 820 мм на участке 715 - 724,5 км (общая протяженность 9,5 км) со строительством вдольтрассовых проездов на участке 715-724,5 км и водопропусков	км	9,5	3 476 845		0	-3 476 845	0%
2	МН "Мартыши-Атырау" ф530. Замена трубы на участках 0-8 км, 18-20 км общей протяженностью 9,3 км	км	9,3	1 899 496		33 166	-1 866 330	2%
3	МН «Павлодар – Шымкент» Д-820 мм. Замена трубопровода на участке 1502,4-1506,4 км (4 км)	км	4	888 827		88 419	-800 408	10%
4	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км		4 708 737		4 708 737	0	100%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН		10	12 093 045		2 302 981	-9 790 064	19%
5	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	объект		976 550		55 035	-921 515	6%
6	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Реконструкция резервуарного парка	объект		300 000		0	-300 000	0%
7	ГНПС Кумколь. Реконструкция резервуарного парка	объект		100 000		13 003	-86 997	13%
8	Строительство химических лабораторий	объект	4	1 938 420		84 652	-1 853 768	4%
9	НПС «Жетыбай». Реконструкция зданий операторной и химической лаборатории	объект	1	951 623		0	-951 623	0%
10	НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОиД нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"	объект	1	943 200		204 023	-739 177	22%
11	НПС Бейнеу. Замена технологических трубопроводов	объект	1	1 289 200		371 529	-917 671	29%
12	Строительство камеры приема-пуска СОиД на ПСП 1235 км нефтепровода Узень-Атырау-Самара	объект	1	1 464 661		697 503	-767 158	48%
13	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система		1 371 500		33 460	-1 338 040	2%
14	НПС "Жетыбай". Реконструкция магистральной насосной	объект		492 824		74 109	-418 715	15%
15	НПС "Косчагил". Внешнее электроснабжение	объект		107 311		14 032	-93 280	13%
16	КНУ. Модернизация энергоснабжения пунктов подогрева нефти с заменой электроприводов участвующих в аварийных защитах печей подогрева»	объект		914 961		447 916	-467 045	49%


№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2022 год		Оперативный факт за 1 полугодие 2022 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
17	НПС им. Т. Касимова. Реконструкция РВС-20000м3 №10 (понтон)	объект	1	67 915		40 583	-27 331	60%
18	Замена технологических трубопроводов на участках входного и выходного коллектора пункта подогрева нефти НПС «Бейнеу»	объект	1	384 955		85 732	-299 223	22%
19	НПС им. Т. Касимова. Ремонт железобетонных емкостей объемом 1200м3	объект		167 168		100 309	-66 859	60%
20	Внедрение систем периметрального видеонаблюдения и системы контроля доступа	система		622 756		81 093	-541 663	13%
21	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	5	703 845	4	496 205	-207 640	70%
21.1	Азотно-компрессорная станция	ед.	1	207 640		0	-207 640	0%
21.2	Насосный агрегат НПВ-1250/60	ед.	1	326 858	1	326 858	0	100%
21.3	Электродвигатель SIEMENS	ед.	3	169 347	3	169 347	0	100%
22	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	2	27 500	1	12 240	-15 260	45%
22.1	Полуприцеп	ед.	1	9 500	1	12 240	2 740	129%
22.2	Трактор	ед.	1	18 000		0	-18 000	0%
Инвестиционная программа на 2022 год								
	ВСЕГО на 2022 год			42 277 820		7 515 360	-34 762 459	18%
	Замена участков нефтепроводов	км	66	30 318 384		6 534 572	-23 783 812	22%
1	МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках общей протяженностью 63 км	км	13	7 980 319		0	-7 980 319	0%
2	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км	40	16 988 884		6 534 572	-10 454 312	38%
3	Замена участка трубопровода МН "Павлодар-Шымкент" Ø820 мм, основная нитка: 5,3 – 16,9км общей протяженностью 11,6 км	км	11,6	4 560 473		0	-4 560 473	0%
4	«Реконструкция МН «Павлодар-Шымкент» Ø820мм на участке 539,212-540,412км протяженностью 1,2 км»	км	1	625 620		0	-625 620	0%
5	МН "Узень-Атырау-Самара" Д 720 мм. Реконструкция участка на 1173 км	км	0,4	163 088		0	-163 088	0%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН		13	11 959 435		980 788	-10 978 647	8%
6	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3	объект	2	1 972 892		0	-1 972 892	0%
7	ГНПС Кумколь. Строительство РВС-10000м3	объект	2	1 554 153		0	-1 554 153	0%
8	ГНПС Узень. Демонтаж-монтаж РВС - 20000 м3 №15	объект	1	632 601		0	-632 601	0%
9	НПС Жетыбай. Реконструкция резервуарного парка 10000м3	объект	2	2 483 367		0	-2 483 367	0%
10	НПС Жетыбай. Реконструкция магистральной насосной	объект	1	2 027 512		0	-2 027 512	0%
11	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" ф 820мм КППОУ НПС "Сузак", КППОУ ГНПС "Чулак-Курган", КПОУ ПСП "Шымкент"	объект	1	176 057		0	-176 057	0%
12	МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км	объект	1	526 144		0	-526 144	0%
13	Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов	система	1	1 256 374		980 788	-275 586	78%
14	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система	1	939 880		0	-939 880	0%
15	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов	система	1	390 457		0	-390 457	0%

* АО «КазТрансОйл» планирует направить заявление на корректировку Инвестиционной программы на 2022 год

МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км



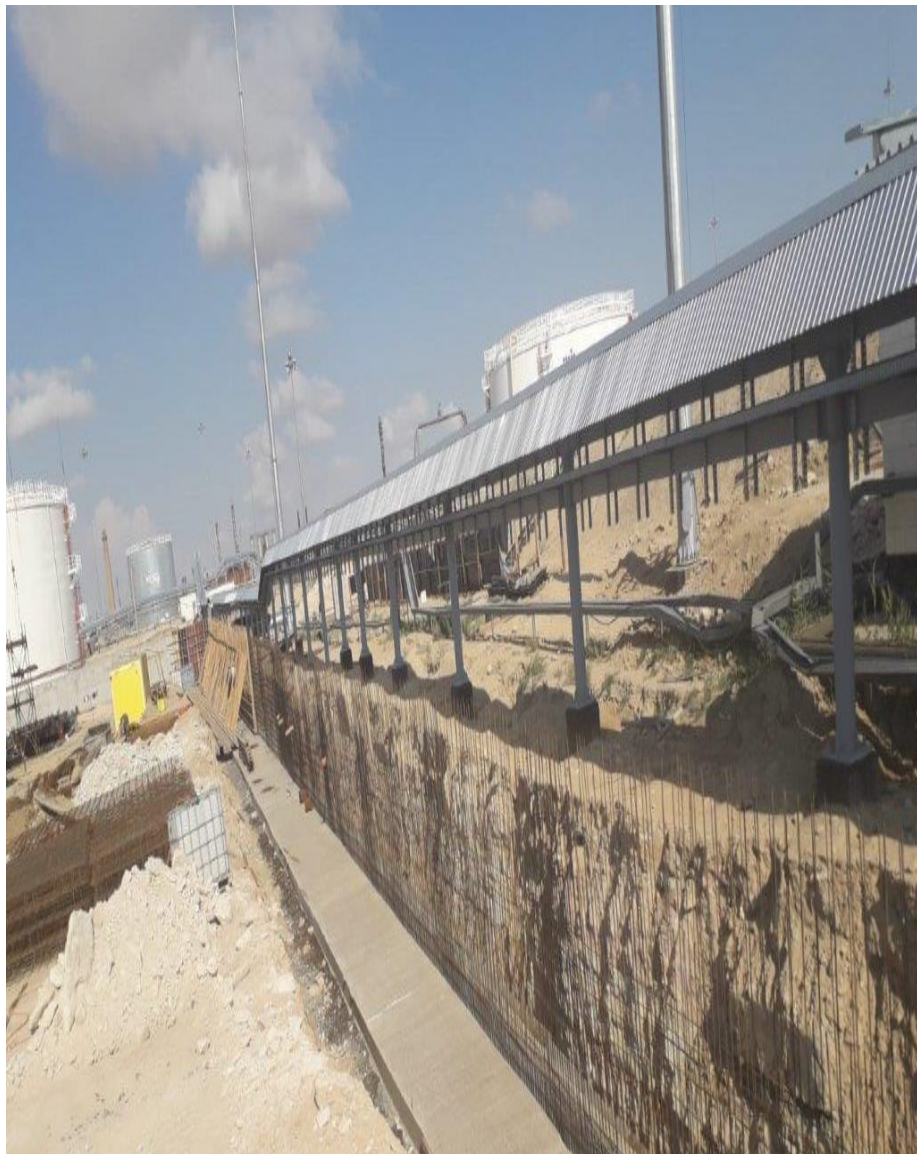

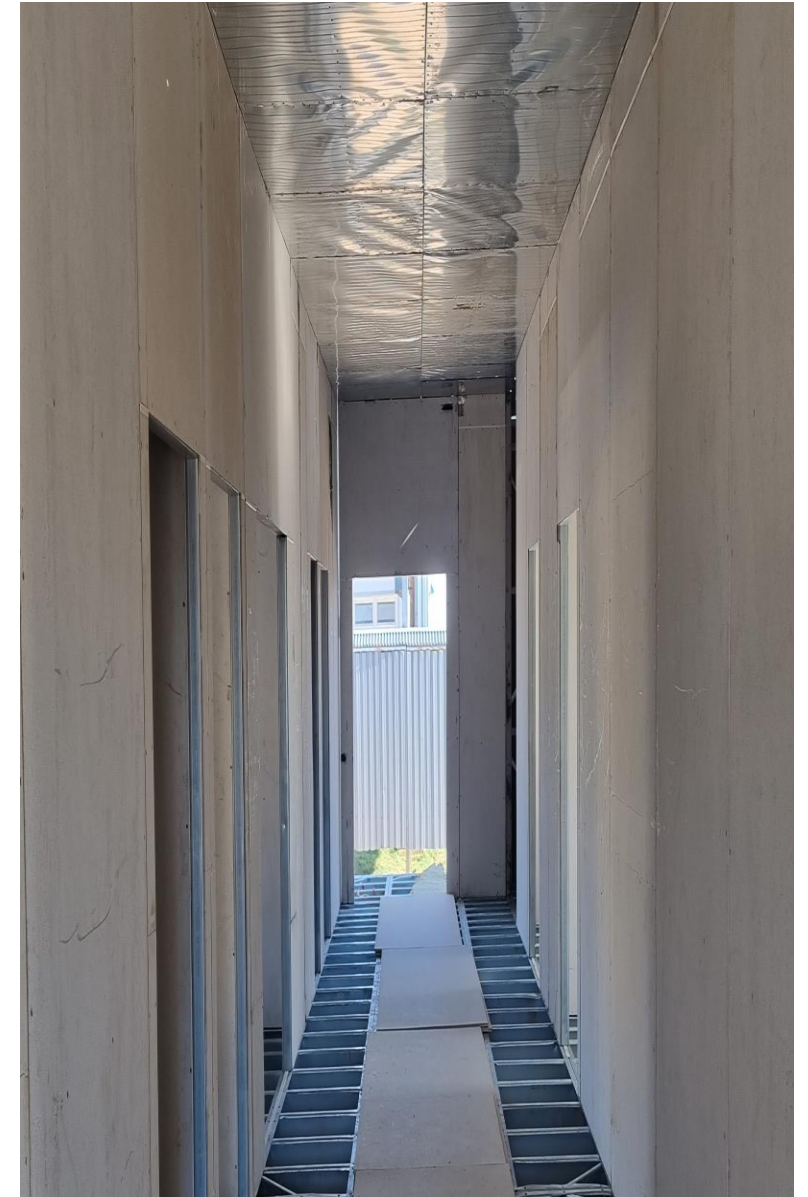

Ссылка на видео <https://www.youtube.com/shorts/0FtvkiLtKsk>

НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОид нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"



НПС Бейнеу. Замена технологических трубопроводов



Строительство камеры приема-пуска СОид на ПСП 1235 км нефтепровода Узень-Атырау-Самара



Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления



КНУ. Модернизация энергоснабжения пунктов подогрева нефти с заменой электроприводов участвующих в аварийных защитах печей подогрева»



НПС им. Т. Касимова. Ремонт железобетонных емкостей объемом 1200м3



Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов

