

**Отчет за 9 месяцев 2022 года об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
(по оперативным данным)**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2022 год		Оперативный факт за 9 месяцев 2022 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
Мероприятия инвестиционной программы 2021 года, перенесенные на 2022 год по причинам, не зависящим от субъекта								
	ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2021 года на 2022 год			23 798 294		8 420 947	-15 377 347	35%
	Замена участков нефтепроводов	км	23	10 973 905		5 002 377	-5 971 528	46%
1	Замена участков трубопровода МН «Павлодар - Шымкент» ф 820 мм на участке 715 - 724,5 км (общая протяженность 9,5 км) со строительством вдольтрассовых проездов на участке 715-724,5 км и водопропусков	км	9,5	3 476 845		172 055	-3 304 790	5%
2	МН "Мартыши-Атырау" ф530. Замена трубы на участках 0-8 км, 18-20 км общей протяженностью 9,3 км	км	9,3	1 899 496		33 166	-1 866 330	2%
3	МН «Павлодар – Шымкент» Д-820 мм. Замена трубопровода на участке 1502,4-1506,4 км (4 км)	км	4	888 827		88 419	-800 408	10%
4	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км		4 708 737		4 708 737	0	100%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН		10	12 093 045		2 910 125	-9 182 919	24%
5	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	объект		976 550		76 267	-900 283	8%
6	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Реконструкция резервуарного парка	объект		300 000		175 173	-124 827	58%
7	ГНПС Кумколь. Реконструкция резервуарного парка	объект		100 000		13 003	-86 997	13%
8	Строительство химических лабораторий	объект	4	1 938 420		174 309	-1 764 111	9%
9	НПС «Жетыбай». Реконструкция зданий операторной и химической лаборатории	объект	1	951 623		6 639	-944 984	1%
10	НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОиД нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"	объект	1	943 200		295 527	-647 673	31%
11	НПС Бейнеу. Замена технологических трубопроводов	объект	1	1 289 200		371 529	-917 671	29%
12	Строительство камеры приема-пуска СОиД на ПСП 1235 км нефтепровода Узень-Атырау-Самара	объект	1	1 464 661		801 016	-663 645	55%
13	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система		1 371 500		33 461	-1 338 039	2%
14	НПС "Жетыбай". Реконструкция магистральной насосной	объект		492 824		74 109	-418 715	15%
15	НПС "Косчагил". Внешнее электроснабжение	объект		107 311		20 502	-86 809	19%
16	КНУ. Модернизация энергоснабжения пунктов подогрева нефти с заменой электроприводов участвующих в аварийных защитах печей подогрева»	объект		914 961		531 421	-383 540	58%

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2022 год		Оперативный факт за 9 месяцев 2022 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
17	НПС им. Т. Касымова. Реконструкция РВС-20000м3 №10 (понтон)	объект	1	67 915		54 825	-13 090	81%
18	Замена технологических трубопроводов на участках входного и выходного коллектора пункта подогрева нефти НПС «Бейнеу»	объект	1	384 955		85 732	-299 223	22%
19	НПС им. Т. Касымова. Ремонт железобетонных емкостей объемом 1200м3	объект		167 168		106 474	-60 694	64%
20	Внедрение систем периметрального видеонаблюдения и системы контроля доступа	система		622 756		90 138	-532 618	14%
21	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	5	703 845	4	496 205	-207 640	70%
21.1	Азотно-компрессорная станция	ед.	1	207 640		0	-207 640	0%
21.2	Насосный агрегат НПВ-1250/60	ед.	1	326 858	1	326 858	0	100%
21.3	Электродвигатель SIEMENS	ед.	3	169 347	3	169 347	0	100%
22	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	2	27 500	1	12 240	-15 260	45%
22.1	Полуприцеп	ед.	1	9 500	1	12 240	2 740	129%
22.2	Трактор	ед.	1	18 000		0	-18 000	0%
Инвестиционная программа на 2022 год								
	ВСЕГО на 2022 год			42 277 820		9 680 598	-32 597 222	23%
	Замена участков нефтепроводов	км	66	30 318 384		7 452 373	-22 866 011	25%
1	МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках общей протяженностью 63 км	км	13	7 980 319		0	-7 980 319	0%
2	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км	40	16 988 884		7 452 373	-9 536 511	44%
3	Замена участка трубопровода МН "Павлодар-Шымкент" Ø820 мм, основная нитка: 5,3 – 16,9км общей протяженностью 11,6 км	км	11,6	4 560 473		0	-4 560 473	0%
4	«Реконструкция МН «Павлодар-Шымкент» Ø820мм на участке 539,212-540,412км протяженностью 1,2 км»	км	1	625 620		0	-625 620	0%
5	МН "Узень-Атырау-Самара" Д 720 мм. Реконструкция участка на 1173 км	км	0,4	163 088		0	-163 088	0%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН		13	11 959 435		2 228 225	-9 731 210	19%
6	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3	объект	2	1 972 892		1 092 586	-880 306	55%
7	ГНПС Кумколь. Строительство РВС-10000м3	объект	2	1 554 153		0	-1 554 153	0%
8	ГНПС Узень. Демонтаж-монтаж РВС - 20000 м3 №15	объект	1	632 601		0	-632 601	0%
9	НПС Жетыбай. Реконструкция резервуарного парка 10000м3	объект	2	2 483 367		0	-2 483 367	0%
10	НПС Жетыбай. Реконструкция магистральной насосной	объект	1	2 027 512		0	-2 027 512	0%
11	Реконструкция камер пуска-приема очистных устройств (КППОУ и КПОУ) МН "Павлодар-Шымкент" ф 820мм КППОУ НПС "Сузак", КППОУ ГНПС "Чулак-Курган", КПОУ ПСП "Шымкент"	объект	1	176 057		0	-176 057	0%
12	МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км	объект	1	526 144		0	-526 144	0%
13	Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов	система	1	1 256 374		1 135 639	-120 735	90%
14	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система	1	939 880		0	-939 880	0%
15	Реконструкция охранно-пожарной сигнализации вспомогательных объектов	система	1	390 457		0	-390 457	0%

* АО «КазТрансОйл» планирует направить заявление на корректировку Инвестиционной программы на 2022 год


Строительство химических лабораторий



НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОиД нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"



Строительство камеры приема-пуска СОид на ПСП 1235 км нефтепровода Узень-Атырау-Самара

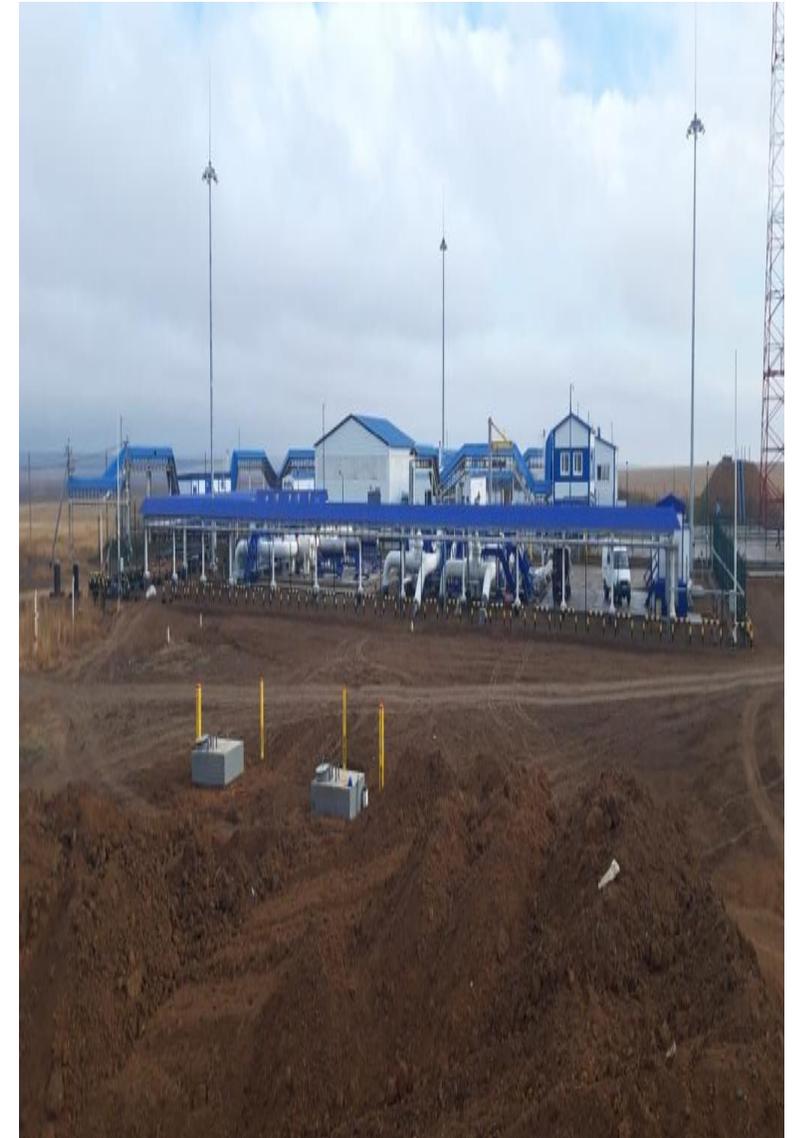

Ссылка на видео <https://www.youtube.com/watch?v=ZodITuZboc0>


КНУ. Модернизация энергоснабжения пунктов подогрева нефти с заменой электроприводов участвующих в аварийных защитах печей подогрева»



НПС "Косчагил". Внешнее электроснабжение



ГНПС им. Б. Джумагалиева. Реконструкция резервуарного парка

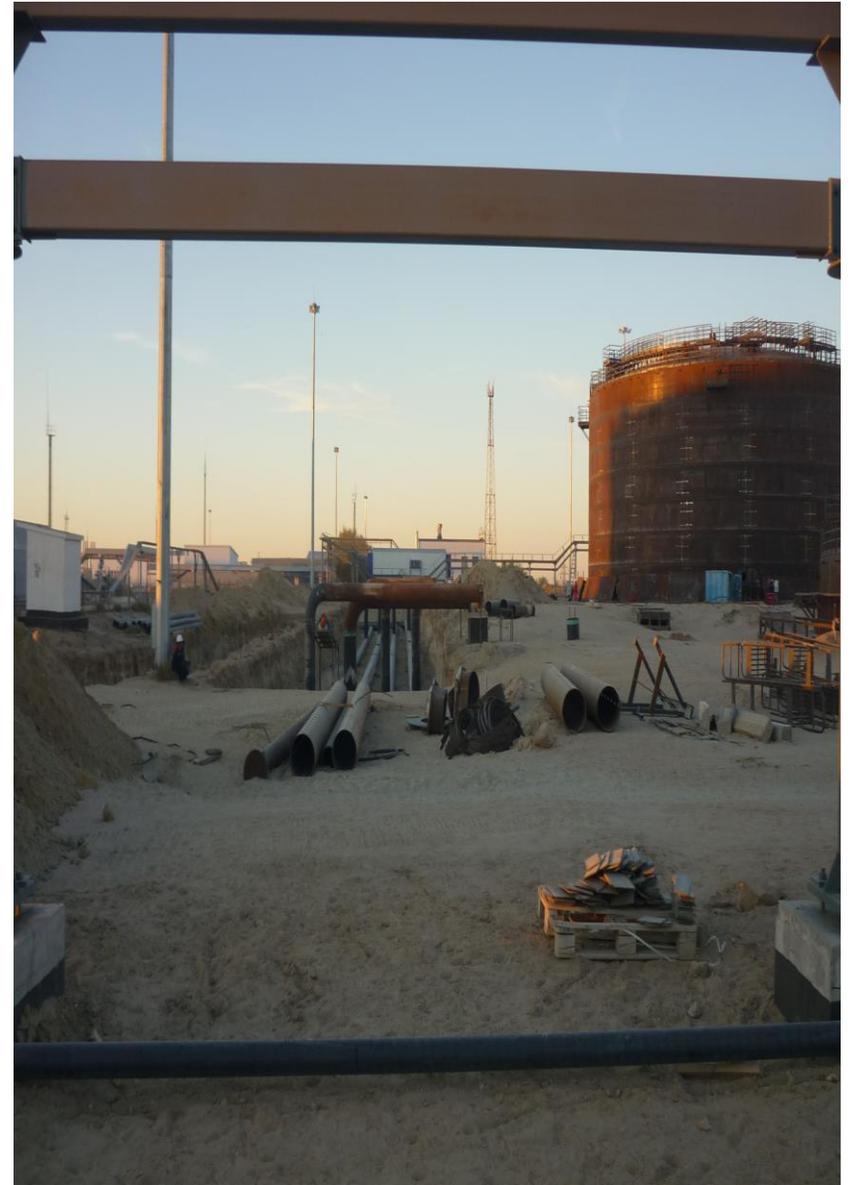

Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов

