


**Отчет за 12 месяцев 2022 года об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
(по оперативным данным)**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2022 год		Фактическое исполнение в 2021 году	Оперативный факт за 12 месяцев 2022 года		ВСЕГО исполнение	Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)			
Мероприятия инвестиционной программы 2021 года, перенесенные на 2022 год по причинам, не зависящим от субъекта										
	ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2021 года на 2022 год			23 798 294	10 796 342		11 576 174	22 372 516	-1 425 778	94%
	Замена участков нефтепроводов	км		10 973 905	5 893 797		5 002 377	10 896 174	-77 731	99%
1	Замена участков трубопровода МН «Павлодар - Шымкент» ф 820 мм на участке 715 - 724,5 км (общая протяженность 9,5 км) со строительством вдольтрассовых проездов на участке 715-724,5 км и водопропусков	км	9,5	3 476 845	3 233 538	9,5	172 055	3 405 593	-71 252	98%
2	МН "Мартыши-Атырау" ф530. Замена трубы на участках 0-8 км, 18-20 км общей протяженностью 9,3 км	км	9,3	1 899 496	1 866 330	9,3	33 166	1 899 496	0	100%
3	МН «Павлодар – Шымкент» Д-820 мм. Замена трубопровода на участке 1502,4-1506,4 км (4 км)	км	4	888 827	793 929	4	88 419	882 348	-6 479	99%
4	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км		4 708 737			4 708 737	4 708 737	0	100%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН			12 093 045	4 902 545		5 824 713	10 727 258	-1 365 787	89%
5	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	объект		976 550	581 555		395 030	976 585	35	100%
6	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Реконструкция резервуарного парка	объект		300 000	124 827		175 173	300 000	0	100%
7	ГНПС Кумколь. Реконструкция резервуарного парка	объект		100 000	23 298		13 003	36 301	-63 699	36%
8	Строительство химических лабораторий	объект	4	1 938 420	1 044 466		238 349	1 282 814	-655 606	66%
9	НПС «Жетыбай». Реконструкция зданий операторной и химической лаборатории	объект	1	951 623	627 685		6 639	634 324	-317 299	67%
10	НПС им.Т.Касымова. Реконструкция камеры пуска СОИД нефтепровода "Узень-Атырау-Самара"	объект	1	943 200	302 044	1	535 581	837 626	-105 575	89%
11	НПС Бейнеу. Замена технологических трубопроводов	объект	1	1 289 200	610 051		652 868	1 262 919	-26 281	98%
12	Строительство камеры приема-пуска СОИД на ПСП 1235 км нефтепровода Узень-Атырау-Самара	объект	1	1 464 661	113 912		1 249 834	1 363 746	-100 915	93%

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2022 год		Фактическое исполнение в 2021 году	Оперативный факт за 12 месяцев 2022 года		ВСЕГО исполнение	Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)			
13	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система		1 371 500	283 890		592 889	876 779	-494 721	64%
14	НПС "Жетыбай". Реконструкция магистральной насосной	объект		492 824	124 830		829 330	954 160	461 335	194%
15	НПС "Косчагил". Внешнее электроснабжение	объект		107 311	3 159		100 175	103 334	-3 977	96%
16	КНУ. Модернизация энергоснабжения пунктов подогрева нефти с заменой электроприводов участвующих в аварийных защитах печей подогрева»	объект		914 961	216 288		698 673	914 961	0	100%
17	НПС им. Т. Касимова. Реконструкция РВС-20000тм3 №10 (понтон)	объект	1	67 915	13 089	1	54 825	67 915	0	100%
18	Замена технологических трубопроводов на участках входного и выходного коллектора пункта подогрева нефти НПС «Бейнеу»	объект	1	384 955	299 223	1	85 732	384 955	0	100%
19	НПС им. Т. Касимова. Ремонт железобетонных емкостей объемом 1200м3	объект		167 168	60 695		106 474	167 168	0	100%
20	Внедрение систем периметрального видеонаблюдения и системы контроля доступа	система		622 756	473 534		90 138	563 672	-59 084	91%
21	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	5	703 845		5	703 805	703 805	-39	100%
21.1	Азотно-компрессорная станция	ед.	1	207 640		1	207 600	207 600	-40	100%
21.2	Насосный агрегат НПВ-1250/60	ед.	1	326 858		1	326 858	326 858	1	100%
21.3	Электродвигатель SIEMENS	ед.	3	169 347		3	169 347	169 347	0	100%
22	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	2	27 500		2	45 280	45 280	17 780	165%
22.1	Полуприцеп	ед.	1	9 500		1	12 240	12 240	2 740	129%
22.2	Трактор	ед.	1	18 000		1	33 040	33 040	15 040	184%
Инвестиционная программа на 2022 год										
	ВСЕГО на 2022 год			42 277 820			20 346 935		-21 930 885	48%
	Замена участков нефтепроводов	км		31 331 339			11 891 449		-19 439 890	38%
1	МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках протяженностью 63 км (общая протяженность -76,5 км)	км		19 131 735			0		-19 131 735	0%
2	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км	45	9 455 120		45	9 428 920		-26 200	100%
3	Реконструкция МН «Павлодар-Шымкент» Ø820мм на участке 539,212-540,412км протяженностью 1,2 км	км	1,2	343 700		1,2	340 401		-3 299	99%
4	МН "Узень-Атырау-Самара" Д 720 мм. Реконструкция участка на 1173 км	км	0,4	471 680			156 074		-315 606	33%
5	МН Павлодар-Шымкент. ПНУ. Замена трубопровода на затопляемых участках с общей протяженностью 10,6км (218-228,6км) ДУ 800	км		1 929 104			1 966 053		36 949	102%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН			8 744 936			6 512 456		-2 232 479	74%
6	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3	объект		4 600 000			3 392 730		-1 207 270	74%
7	МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км	объект		606 319			208 707		-397 612	34%
8	Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов	объект	3	1 298 908		3	1 298 908		-0	100%
9	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	объект		374 417			0		-374 417	0%

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План на 2022 год		Фактическое исполнение в 2021 году	Оперативный факт за 12 месяцев 2022 года		ВСЕГО исполнение	Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)			
10	Модернизация системы охраны нефтепровода	объект	2	379 117		2	379 017		-100	100%
11	Комплексная реконструкция системы связи в ПКУ	объект	2	1 224 069		2	1 221 834		-2 235	100%
12	Обновление DeltaV СИКН	система	7	262 106		1	11 260		-250 846	4%
13	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	55	1 301 645		29	1 043 130		-258 515	80%
13.1	Анализатор спектроскан CLSW	ед.	1	42 750		1	42 750		0	100%
13.2	Аппарат определения температуры застывания нефти	ед.	2	44 200		2	44 200		0	100%
13.3	Вискозиметр НVM 472	ед.	1	35 620		1	35 620		0	100%
13.4	Серомер автоматический рентгенофлуоресцентный	ед.	2	28 500		2	28500		0	100%
13.5	Хромотограф газовый "КРИСТАЛЛ-5000.2"	ед.	5	101 129		5	101 129		0	100%
13.6	Экспресс-анализатор ERAVAP	ед.	4	83 543		4	83543		0	100%
13.7	Сенсор расходомера с преобразователем	ед.	1	31 450					-31 450	0%
13.8	Виброанализатор СД-23	ед.	3	79 740		3	79 740		0	100%
13.9	Машина безогневой резки труб ФАЙН Ф530-820	ед.	3	99 450		3	99 450		0	100%
13.10	Покрытие дорожное сборное-разборное L=200м	ед.	1	143 564		1	143 564		0	100%
13.11	Привод электрический с редуктором AUMA	ед.	25	227 065					-227 065	0%
13.12	Скребок очистной струйный ДУ800мм	ед.	2	28 458		2	28 458		0	100%
13.13	Установка насосная DNUDO(OIL)-300/360	ед.	4	307 428		4	307 428		0	100%
13.14	Насос 12НДСН	ед.	1	48 748		1	48 748		0	100%
14	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	18	899 900		18	899 900		0	100%
14.1	Автобус вахтовый КАМАЗ 43118 28П/М	ед.	3	117 000		3	117 000		0	100%
14.2	Автокран КС-45717К-3 КАМАЗ 25тонн	ед.	1	77 000		1	77 000		0	100%
14.3	Автомобиль АРМТ КАМАЗ	ед.	1	89 800		1	89 800		0	100%
14.4	Автомобиль бортовой КАМАЗ-43502-66	ед.	2	72 000		2	72 000		0	100%
14.5	Автомобиль грузопассажирский КАМАЗ-43118	ед.	4	198 000		4	198 000		0	100%
14.6	Экскаватор-погрузчик HIDROMEK НМК 102	ед.	1	45 600		1	45 600		0	100%
14.7	Лаборатория ЭХЗИВЛ на базе КАМАЗ-43118	ед.	1	83 000		1	83 000		0	100%
14.8	Автобус на 45 посадочных мест	ед.	1	68 100		1	68 100		0	100%
14.9	Автобус ВЕКТОР NEXT 8.8	ед.	4	149 400		4	149 400		0	100%

* АО «КазТрансОйл» направил заявление на корректировку Инвестиционной программы на 2022 год

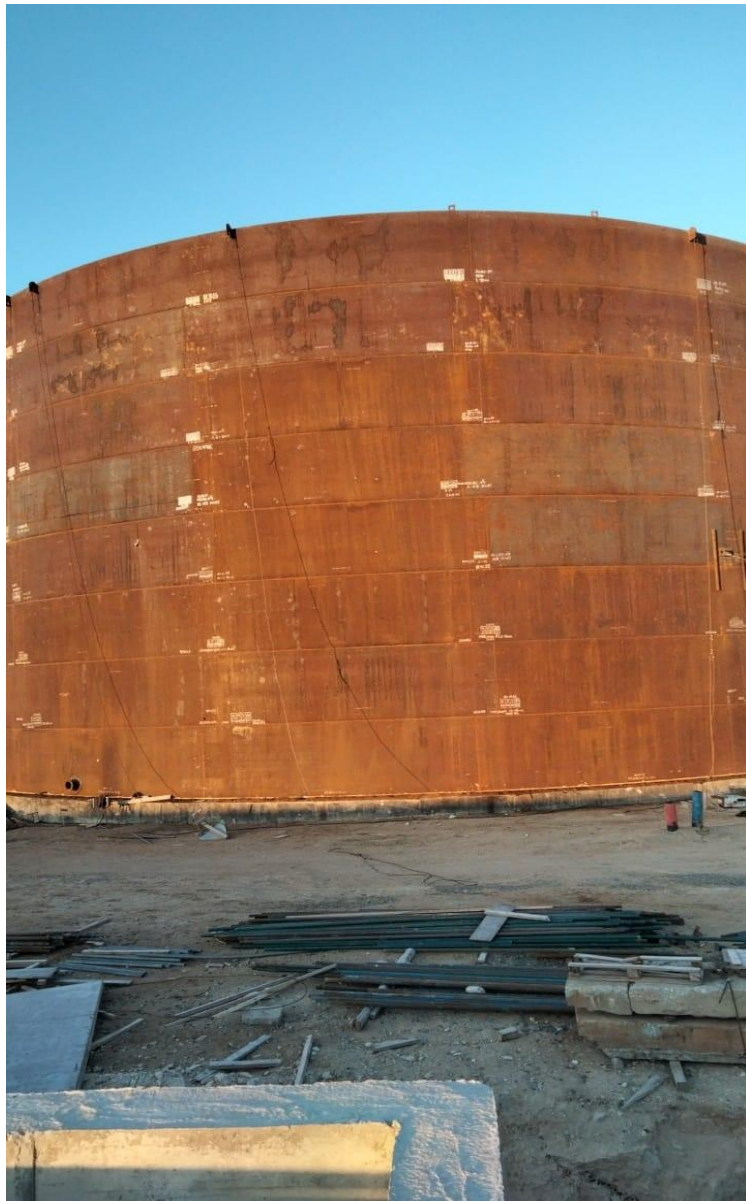

Ссылка на видео <https://youtube.com/shorts/9-cidYPCILU?feature=share>

МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км



Строительство химических лабораторий



МН Павлодар-Шымкент. ПНУ. Замена трубопровода на затопляемых участках с общей протяженностью 10,6км (218-228,6км) ДУ 800



МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км




НПС Бейнеу. Замена технологических трубопроводов



Строительство камеры приема-пуска СОид на ПСП 1235 км нефтепровода Узень-Атырау-Самара



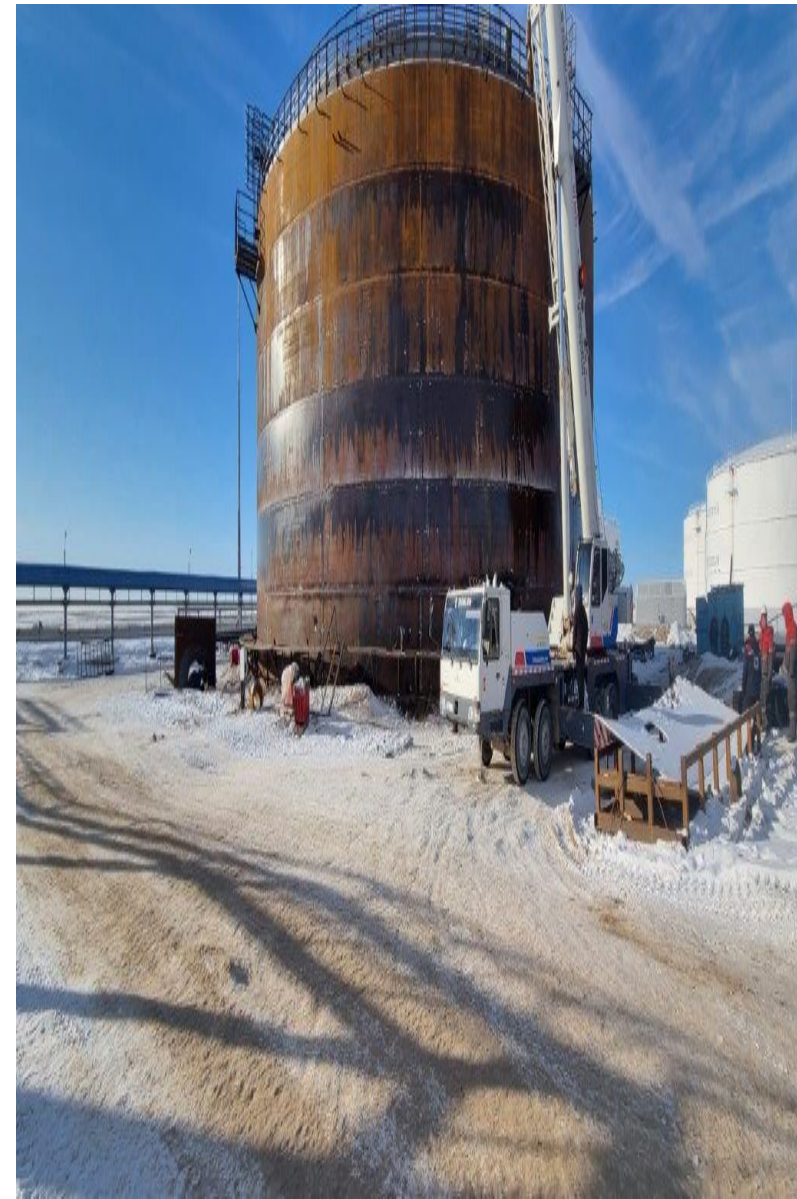

Обеспечение полной зоны покрытия устойчивой радиосвязью вдоль магистральных нефтепроводов

