

**Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
за 1 полугодие 2023 года (по оперативным данным)**

тыс тенге



№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План		Оперативный факт за 1 полугодие 2023 года		Отклонение (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
Мероприятия инвестиционной программы 2022 года, перенесенные на 2023 год по причинам, не зависящим от субъекта								
	ВСЕГО по перенесенным мероприятиям с 2022 года на 2023 год			25 704 772		20 549 436	-5 155 336	80%
	Замена участков нефтепроводов	км		19 603 415		19 131 735	-471 680	98%
1	МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках протяженностью 63 км (общая протяженность -76,5 км)	км		19 131 735		19 131 735	0	100%
2	МН "Узень-Атырау-Самара" Д 720 мм. Реконструкция участка на 1173 км	км	0,4	471 680		0	-471 680	0%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН			5 842 842		1 417 701	-4 425 141	24%
3	ГНПС им. Б. Джумагалиева. Строительство РВС-20000м3	объект		4 600 000		559 205	-4 040 795	12%
4	МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км	объект		606 319		802 445	196 126	132%
5	ГНПС. Узень-Демонтаж-монтаж РВС-20 000м3 №17	объект		374 417		0	-374 417	0%
6	Обновление DeltaV СИКН	система	7	262 106		56 051	-206 055	21%
7	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	26	258 515		0	-258 515	0%
7.1	Привод электрический с редуктором AUMA	ед.	25	227 065		0	-227 065	0%
7.2	Сенсор расходомера с преобразователем	ед.	1	31 450		0	-31 450	0%
Инвестиционная программа на 2023 год								
	ВСЕГО на 2023 год			40 675 775		4 256 604	-36 419 170	10%
	Замена участков нефтепроводов	км	55	34 099 723		4 149 713	-29 950 010	12%
1	МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках общей протяженностью 63 км	км	50	31 918 685		4 149 713	-27 768 972	13%
2	МН "Узень-Атырау-Самара" Д720 мм. Замена трубопровода на участке общей протяженностью 45 км	км	5	2 181 038		0	-2 181 038	0%
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов МН			5 628 250		106 892	-5 521 358	2%
3	ГНПС Узень.Демонтаж-монтаж РВС - 20000 м3 №15	объект	1	657 949		0	-657 949	0%
4	НПС Жетыбай. Реконструкция магистральной насосной	объект	1	527 093		106 892	-420 201	20%
5	Строительство химической лаборатории на НПС им. Касымова	объект	1	655 149		0	-655 149	0%
6	КНУ. Реконструкция печи подогрева (СПН Опорная, №3; НПС им.Култумиева, №2)	объект	2	557 210		0	-557 210	0%
7	ЛПДС «Каражанбас». Нефтепровод «Каламкас – Каражанбас – Актау». Реконструкция ВЛ-10кВ «Каражанбас – Кияхты» на участке 62 – 107км, протяженностью 45км	объект	1	357 948		0	-357 948	0%
8	Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации и электроуправления	система	1	1 112 629		0	-1 112 629	0%
9	Реконструкция систем ПАЗ	система	1	1 074 306		0	-1 074 306	0%
10	Реконструкция АСУТП и внедрение системы ПАЗ ННП "Шагыр", ГНПС "Алибекмола"	система	1	685 966		0	-685 966	0%


**Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы
на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл»
за 1 полугодие 2023 года (по оперативным данным)**


тыс тенге

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Единица измерения	План		Оперативный факт за 1 полугодие 2023 года		Отклонение, (абс)	Исполнение, (%)
			Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)	Количество	Сумма инвестиций (без налога на добавленную стоимость)		
11	Приобретение автотранспортных средств и специальной техники производственного назначения	ед.	11	523 567		0	-523 567	0%
11.1	АВТОМОБИЛЬ УАЗ 39099 , грузопассажирский, 7 пассаж/м	ед.	1	9 196		0	-9 196	0%
11.2	АВТОМОБИЛЬ УАЗ 39094 ФЕРМЕР, грузопассажирский, 7 пассаж/м	ед.	1	9 196		0	-9 196	0%
11.3	Самосвал КамАЗ-45141-10, г/п 9,5 тн.	ед.	1	44 165		0	-44 165	0%
11.4	ГПА на базе Камаз-43118. Колесная формула 6Х6.	ед.	1	91 960		0	-91 960	0%
11.5	Коммунальный Трактор МТЗ 82.1 Отвал, щётка, борона дисковая, плуг трех-корпусной, косилка роторного типа КРН-2.1	ед.	1	20 570		0	-20 570	0%
11.6	УСТАНОВКА ППУ-1900/100 НА БАЗЕ КАМАЗ	ед.	1	67 155		0	-67 155	0%
11.7	АВТОМОБИЛЬ АРМТ на базе КАМАЗ-43118.	ед.	1	99 825		0	-99 825	0%
11.8	Тягач КАМАЗ-44108	ед.	1	44 165		0	-44 165	0%
11.9	Тягач КАМАЗ-44108	ед.	1	44 165		0	-44 165	0%
11.10	Коммунальный Трактор МТЗ 82.1 Отвал, щётка, борона дисковая, плуг трех-корпусной, косилка роторного типа КРН-2.1	ед.	1	20 570		0	-20 570	0%
11.11	КАМАЗ 43118 БОРТОВОЙ С КМУ	ед.	1	72 600		0	-72 600	0%
12	Приобретение оборудования производственного назначения	ед.	9	424 236		0	-424 236	0%
12.1	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТП-2500-2УХЛ4	шт.	1	185 200		0	-185 200	0%
12.2	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АЗМВ1250/10000	шт.	1	109 000		0	-109 000	0%
12.3	УСТРОЙСТВО РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДИОГЕН СКС 700ММ	ед.	1	17 000		0	-17 000	0%
12.4	УСТРОЙСТВО РАЗМЫВА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДИОГЕН СКС 700ММ	ед.	1	17 000		0	-17 000	0%
12.5	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ЗКЛПЭ ДУ 500 РУ75	ед.	2	38 414		0	-38 414	0%
12.6	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ ДУ 500 РУ 75	ед.	1	19 207		0	-19 207	0%
12.7	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ПРИВАРНАЯ ДУ 500 РУ 75	ед.	2	38 414		0	-38 414	0%

МН "Узень-Атырау-Самара" Д1020 мм. Замена трубопровода на участках протяженностью 63 км (общая протяженность -76,5 км)

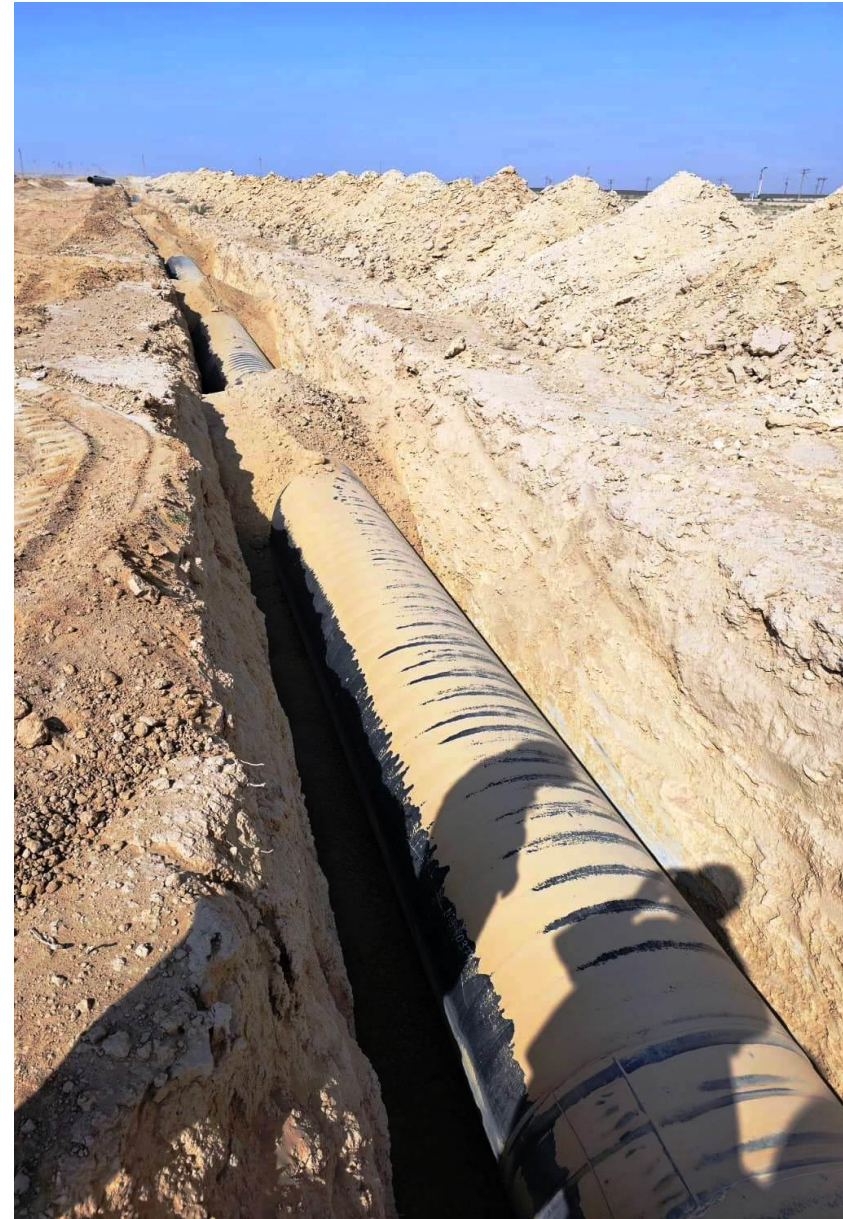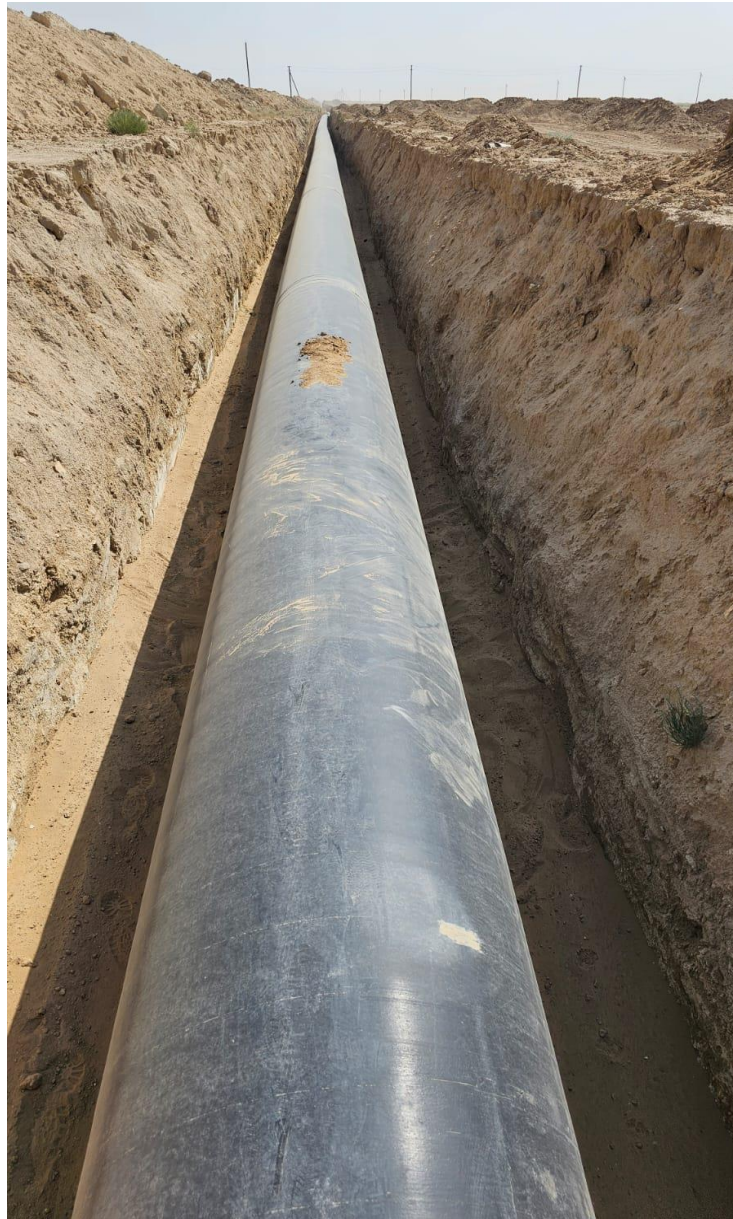

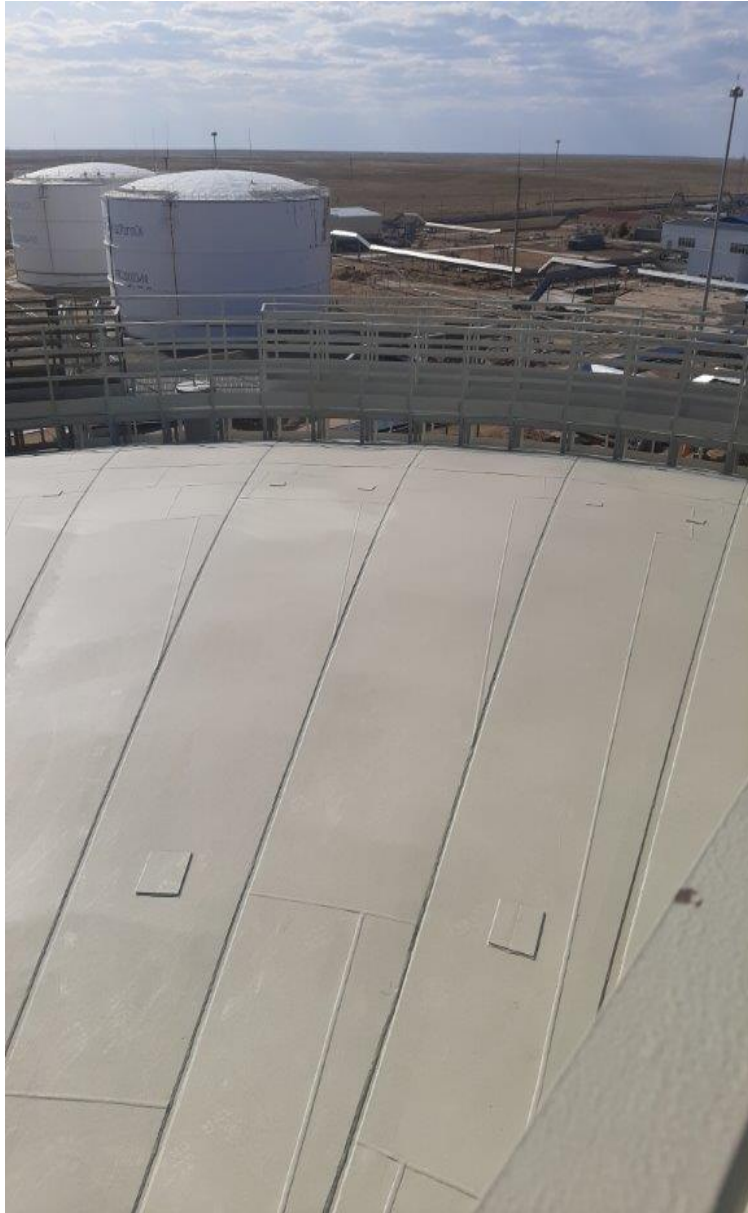

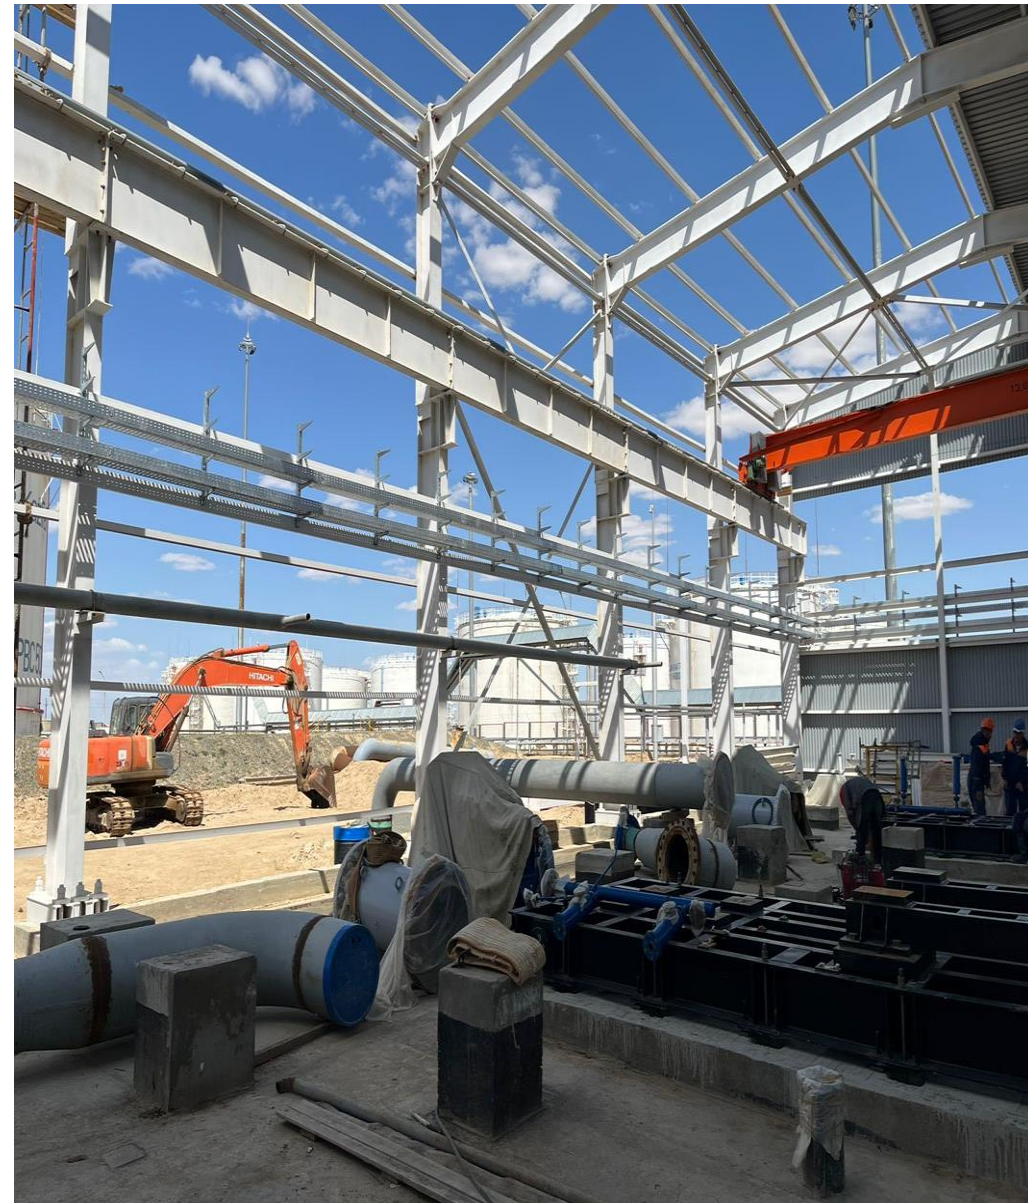

Ссылка на видео <https://youtu.be/1QlZU0nIEgw>

МН "Павлодар-Шымкент". Реконструкция ВЛ-10кВ на участке 1499,9-1572,1км

